Easy Peasy mit 10 Fingern schreiben

Briefing

MULTIMEDIA
PRODUZENTEN GMBH

SH Schleswig-Holstein
Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Projektleitung: Melanie Thol

Juni, 8 2021

Fahrplan

SCHREIBPROGRAMM

RICHTZIEL

NUTZEN

ZEITRAHMEN

MEILENSTEINE



NEXT STEPS

TEAMAUFBAU

BUDGET

RISIKEN

AUFGABEN

Was soll entstehen?

Das Schreibprogramm

LERNINHALT

Grundschüler erlernen das 10-Finger-Tastschreiben

METHODE

Geschichten, Bilder, Farben, Videos, interaktive Übungen

HIGHLIGHT

Lehrerunabhängig, Bewegungsphasen, inklusive Ausrichtung

Unsere Vision

→ autonomes Lernen - im eigenen Tempo unterwegs

Das Schreibprogramm kann in Ihr LMS integriert werden. Mit dem Begleitmaterial lässt sich das WBT auch als Blended Learning einsetzen. Die Schüler können bereits im 2. Halbjahr 2021/2022 mit dem Training losgehen.

Mit Videos, interaktiven Lern- und Wiederholungssequenzen und einem hohen Grad an Barrierefreiheit ist der Einstieg spielend leicht und das Dranbleiben auch!

Der Nutzen

- Für das Arbeiten am und mit dem Computer begeistern
- Medienkompetenzen fördern
- inklusiven Unterricht gestalten
- Berufsvorbereitung
- Gesundheitsprävention
- Reputation der Schulen voranbringen

Der Zeitplan

8. Juni 2021

PHASE 1

Briefing:
Anforderungen &
Wünsche

Ende Juni 2021

PHASE 2

Projektstart:
Design &
Konzept

September/Oktober 2021

PHASE 3

Software-
entwicklung &
Videoproduktion

Jahresende 2021

PHASE 4

Projektende:
Qualitätssicherung &
Abnahme

Meilenstein #9
Das Projekt ist beendet.

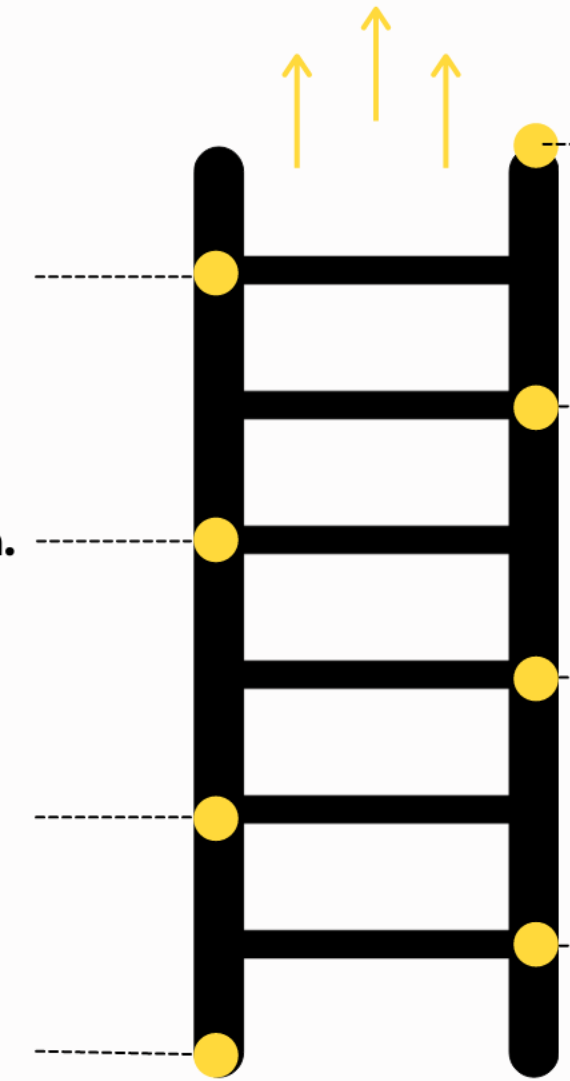

Meilenstein #8
Der Prototyp ist entwickelt.

Meilenstein #7
Das Begleitmaterial ist erstellt.

Meilenstein #6
Die Videos sind erstellt.

Meilenstein #5
Die Drehbücher sind abgenommen.

Meilenstein #4
Das Screendesign ist abgenommen.

Meilenstein #3
Das Konzept ist abgenommen.

Meilenstein #2
Die Geschichte ist konzipiert.

Meilenstein #1
Das Projekt ist freigegeben.

Störungen, Risiken, Chancen

- Krankheitswelle, Ausscheiden
- institutionell bedingte Verzögerungen
- Aufwände fallen höher aus
- Kundenwünsche werden nicht erfüllt
- Cloudserverausfall
- Rechtliche Änderungen
- Ein nachhaltigeres Lernmedium entsteht
- Möglichst wenige personenbezogene Daten

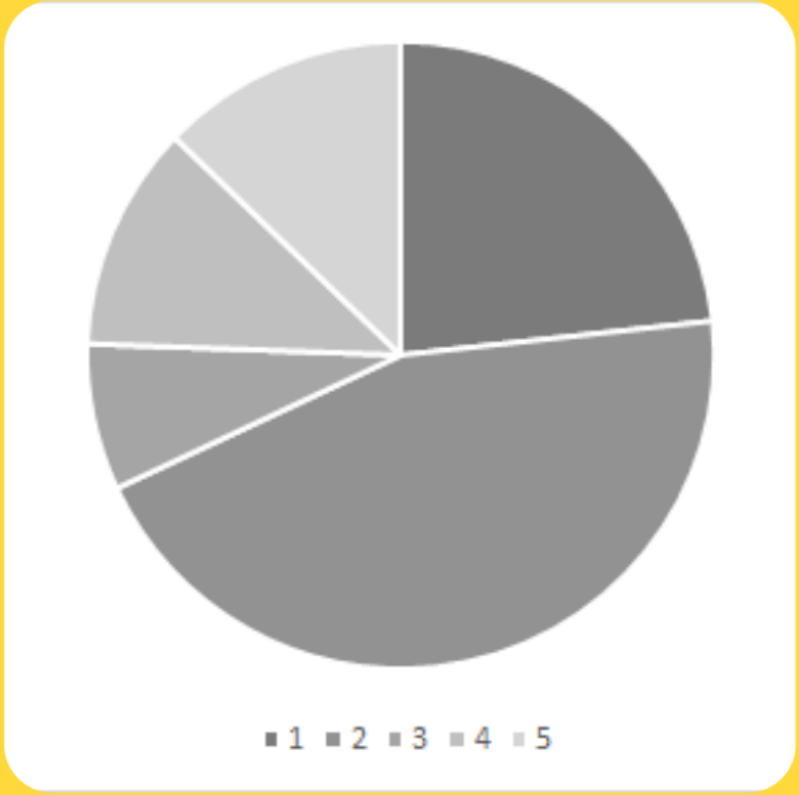

EASY PEASY MIT 10 FINGERN SCHREIBEN

ENTWICKLUNGS-BUDGET

GESAMTBUDGET: 180.000 €

1.Design
- 40.000 €

2. Konzept
- 77.000 €

3. Entwicklung
- 13.000 €

4. Videos
- 20.000 €

5. PM und QS
- 22.000 €

Ihr MultiMedia Produktionsteam

Melanie Thol
Projektleiterin
mthol@mmproduktion.de

Parzival Projekt
Projektmanager
pprojekt@mmproduktion.de

Marvin Media
Medienautor
mmedia@mmproduktion.de

Davud Design
Grafik Designer
ddesign@mmproduktion.de

Severin Software
Softwareentwickler
ssoftware@mmproduktion.de

Vlad Video
Videoproduzent
vvideo@mmproduktion.de

Next Steps

SPEZIFIKATIONEN

Gemeinsamer Austausch zur Klärung der Anforderungen

ARBEITSPAKETE

Verantwortungen und Aufgaben zuweisen, Arbeitsschritte abbilden

KONZEPTION

Auf Grundlage der Anforderungen und des Corporate Designs geht es an die Ausarbeitung
